



El futuro es de todos  
Ministerio del Interior


**DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS**  
**FICHAS DE RELATORIA**



<b>FECHA:</b>	16 de Septiembre de 2020
<b>LUGAR:</b>	Sector Religioso Departamento del Cauca
<b>MODALIDAD:</b> (virtual/presencial)	Virtual- Aplicación ZOOM con 72 participantes
<b>LINK CONVOCATORIA:</b>	<a href="https://zoom.us/j/95856036931">https://zoom.us/j/95856036931</a>

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

Inserte imágenes

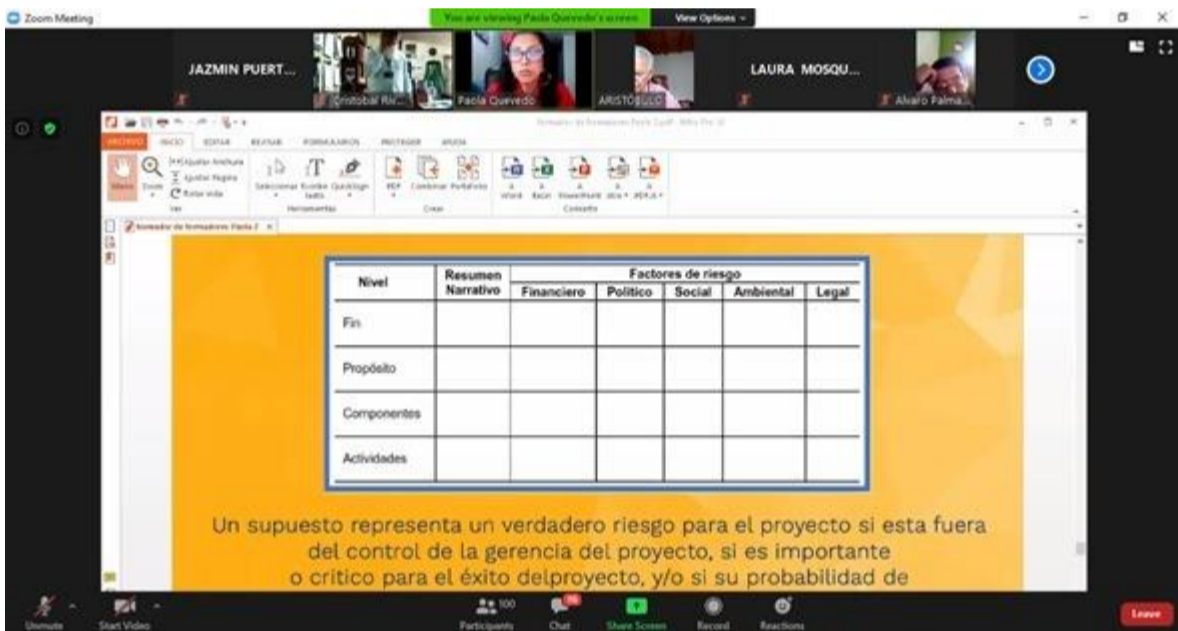

**1. TEMA DE REUNIÓN: CAPACITACIÓN 2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES. ESTRATEGIA FORMADOR DE FORMADORES**

**2. AGENDA:**

- a. Apertura y presentación del Tema
- b. Desarrollo del Taller
- c. Preguntas y Respuestas
- d. Conclusiones y cierre.

**3. DESARROLLO:**

- a. Apertura y Presentación del Tema: Contando con 100 participantes, Paola Quevedo dio un saludo de bienvenida e introdujo a la Dra. Lorena Ríos, Directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, quien dio un saludo agradeciendo a los participantes por su compromiso con éste proceso, explicando que esta iniciativa surgió al identificar la labor social que el sector religioso desarrolla y la necesidad de visibilizarla y generar mayor impacto. Seguidamente dio un saludo el enlace territorial, Jazmín Puerto motivando a todos a estar atentos y registrar el link de asistencia.



- b. Desarrollo del Taller

Taller II para la formulación y Ejecución de Proyectos Sociales: Paola Quevedo inició retomando la siguiente matriz de planeación del proyecto:

<b>Planteamiento del proyecto</b>			
<b>Matriz de planeación del proyecto</b>			
Estrategia del proyecto	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
Finalidad			
<b>Objetivo Principal</b>			
Productos/Resultados: ¿Qué entregará el proyecto? Son las obras estudios, servicios o capacitación que el proyecto generará.	Identifican el logro de los objetivos en cantidad, calidad, tiempo y región. Describe cuánto, cuándo, dónde y cuán positivo es.	Información donde se obtienen los datos necesarios para verificar el alcance del indicador	Factores externos al control del Proyecto pero Necesarios para el éxito del Proyecto. Son los riesgos ambientales, políticos, financieros, institucionales, sociales requeridos para que se cumplan los objetivos.
Actividades: ¿Qué se hará? Acciones que se desarrollaran de forma sistemática. (Crear Cronograma)	<b>PRESUPUESTO</b>		

Luego de realizar una explicación general del cuadro, se profundizó en cada aspecto. Se desarrolló el tema así:

- Elección de las Alternativas de Solución: Se presentaron las características que debían tener y el proceso para seleccionarlas.
- Se presentó la forma de crear la estructura analítica del proyecto
- Se explicó la forma de redactar el resumen narrativo del fin, objetivo y productos

 <p>El futuro es de todos Mininterior</p>	<p><b>DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS</b></p> <p><b>FICHAS DE RELATORIA</b></p>	 <p><b>Asuntos Religiosos</b></p>
--	---	--

- Se dio a conocer la lógica vertical de los objetivos según el marco lógico
- Se enseñaron los requisitos para formular indicadores
- Se explicó qué son los medios de verificación y como se establecen
- Se definieron los supuestos y la metodología para ubicarlo en la matriz
- Se dieron tips importantes para hacer seguimiento y evaluación a un proyecto partiendo del ciclo PHVA que promueve la mejora continua según los modelos de gestión de calidad.
- Se enseñó la forma de establecer el plan operativo del proyecto

**CONCLUSIONES:**

- La elección adecuada de las alternativas de solución marca las líneas de acción del proyecto y los indicadores.
- Todo proyecto social requiere ser monitoreado y evaluado para medir su impacto
- La ejecución de un proyecto demanda control sobre el presupuesto y el cronograma de actividades

Finalmente Paola Quevedo compartió el video de saludo por parte de la Dra Lorena Ríos. Algunos participantes manifestaron su gratitud y evaluaron como excelente la capacitación. Uno de ellos solicita se les capacite a profundidad en evaluación de Proyectos sociales.

Jazmín solicita la repetición de esta capacitación en el cauca con muchas personas del sector que no lograron conectarse por el limite de cupo, a lo cual Paola quedo de consultar con la Dirección dicha posibilidad para el mes de Octubre.

Paola se comprometió a enviar a Jazmín las presentaciones y listado de asistencia al finalizar el taller, y la próxima semana los certificados virtuales al enlace para que los haga llegar a los participantes.
